

FICHE DE CONSIGNATION


Date d'intervention :		Nom du chargé de consignation :	
Installation concernée :			
Motif de la consignation :			
<i>Etapas de consignation</i>	<i>Electrique</i>	<i>Fluide / Gaz</i>	<i>mécanique (hydraulique, pneumatique)</i>
SEPARATION	Mise hors tension <input type="checkbox"/> Mise hors tension du circuit de puissance <input type="checkbox"/> Par boîtier canalis <input type="checkbox"/> Par sectionneur et/ou disjoncteur <input type="checkbox"/> Mise hors tension du circuit de commande <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	Suppression des arrivées <input type="checkbox"/> De fluides (gaz, liquide, fluide) <input type="checkbox"/> De solides <input type="checkbox"/> Circuit auxiliaire <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) :	Coupure de la transmission <input type="checkbox"/> De l'énergie (hydraulique, pneumatique) <input type="checkbox"/> Y compris de secours <input type="checkbox"/> Accumulateur d'énergie <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) :
CONDAMNATION	<input type="checkbox"/> Boîtier canalis <input type="checkbox"/> Déconnecter fusibles enlevés <input type="checkbox"/> Sectionneur cadencassé <input type="checkbox"/> Clef enlevée <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Robinet ou vanne condamné <input type="checkbox"/> Tiroir condamné <input type="checkbox"/> Simple isolement (purge/atmosphère) <input type="checkbox"/> Double isolement (décompression/renforcé) <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	Elément de transmission <input type="checkbox"/> Supprimé (courroie, autre, ...) <input type="checkbox"/> Décomprimé (ressort, autre, ...) <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :
SIGNALISATION	<input type="checkbox"/> Par panneau ou étiquette <input type="checkbox"/> Autre moyen de signalisation (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Par panneau ou étiquette <input type="checkbox"/> Autre moyen de signalisation (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Par panneau ou étiquette <input type="checkbox"/> Autre moyen de signalisation (à préciser) :
DISSIPATION PURGE	<input type="checkbox"/> Mise à la terre du circuit <input type="checkbox"/> Décharge des condensateurs <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Vidange <input type="checkbox"/> Nettoyage <input type="checkbox"/> Ventilation <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Mise à niveau le plus bas (arrêt mécanisme) <input type="checkbox"/> Mise à la pression atmosphérique <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :
<i>Etapas de consignation</i>	<i>Electrique</i>	<i>Fluide / Gaz</i>	<i>mécanique (hydraulique, pneumatique)</i>

FICHE DE CONSIGNATION

VERIFICATION	Pas de tension entre : <input type="checkbox"/> Phases <input type="checkbox"/> Phase neutre <input type="checkbox"/> Phase ou neutre et terre	<input type="checkbox"/> Pas de pression <input type="checkbox"/> Pas d'écoulement	Absence d'énergie par : <input type="checkbox"/> Tension <input type="checkbox"/> Pression <input type="checkbox"/> Mouvement
IDENTIFICATION	<input type="checkbox"/> Schéma électrique à jour <input type="checkbox"/> Documentation constructeur à jour <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Synoptique, PID à jour <input type="checkbox"/> Documentation constructeur à jour <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :	<input type="checkbox"/> Synoptique, schéma, PID à jour <input type="checkbox"/> Documentation constructeur à jour <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :
ESSAIS REGLAGE DE FONCTIONNEMENT			
DECONSIGNATION	Date : Heure :	Chargé de déconsignation :	Visa :

FICHE DE CONSIGNATION

SYNOPTIQUE DE MISE EN SECURITE

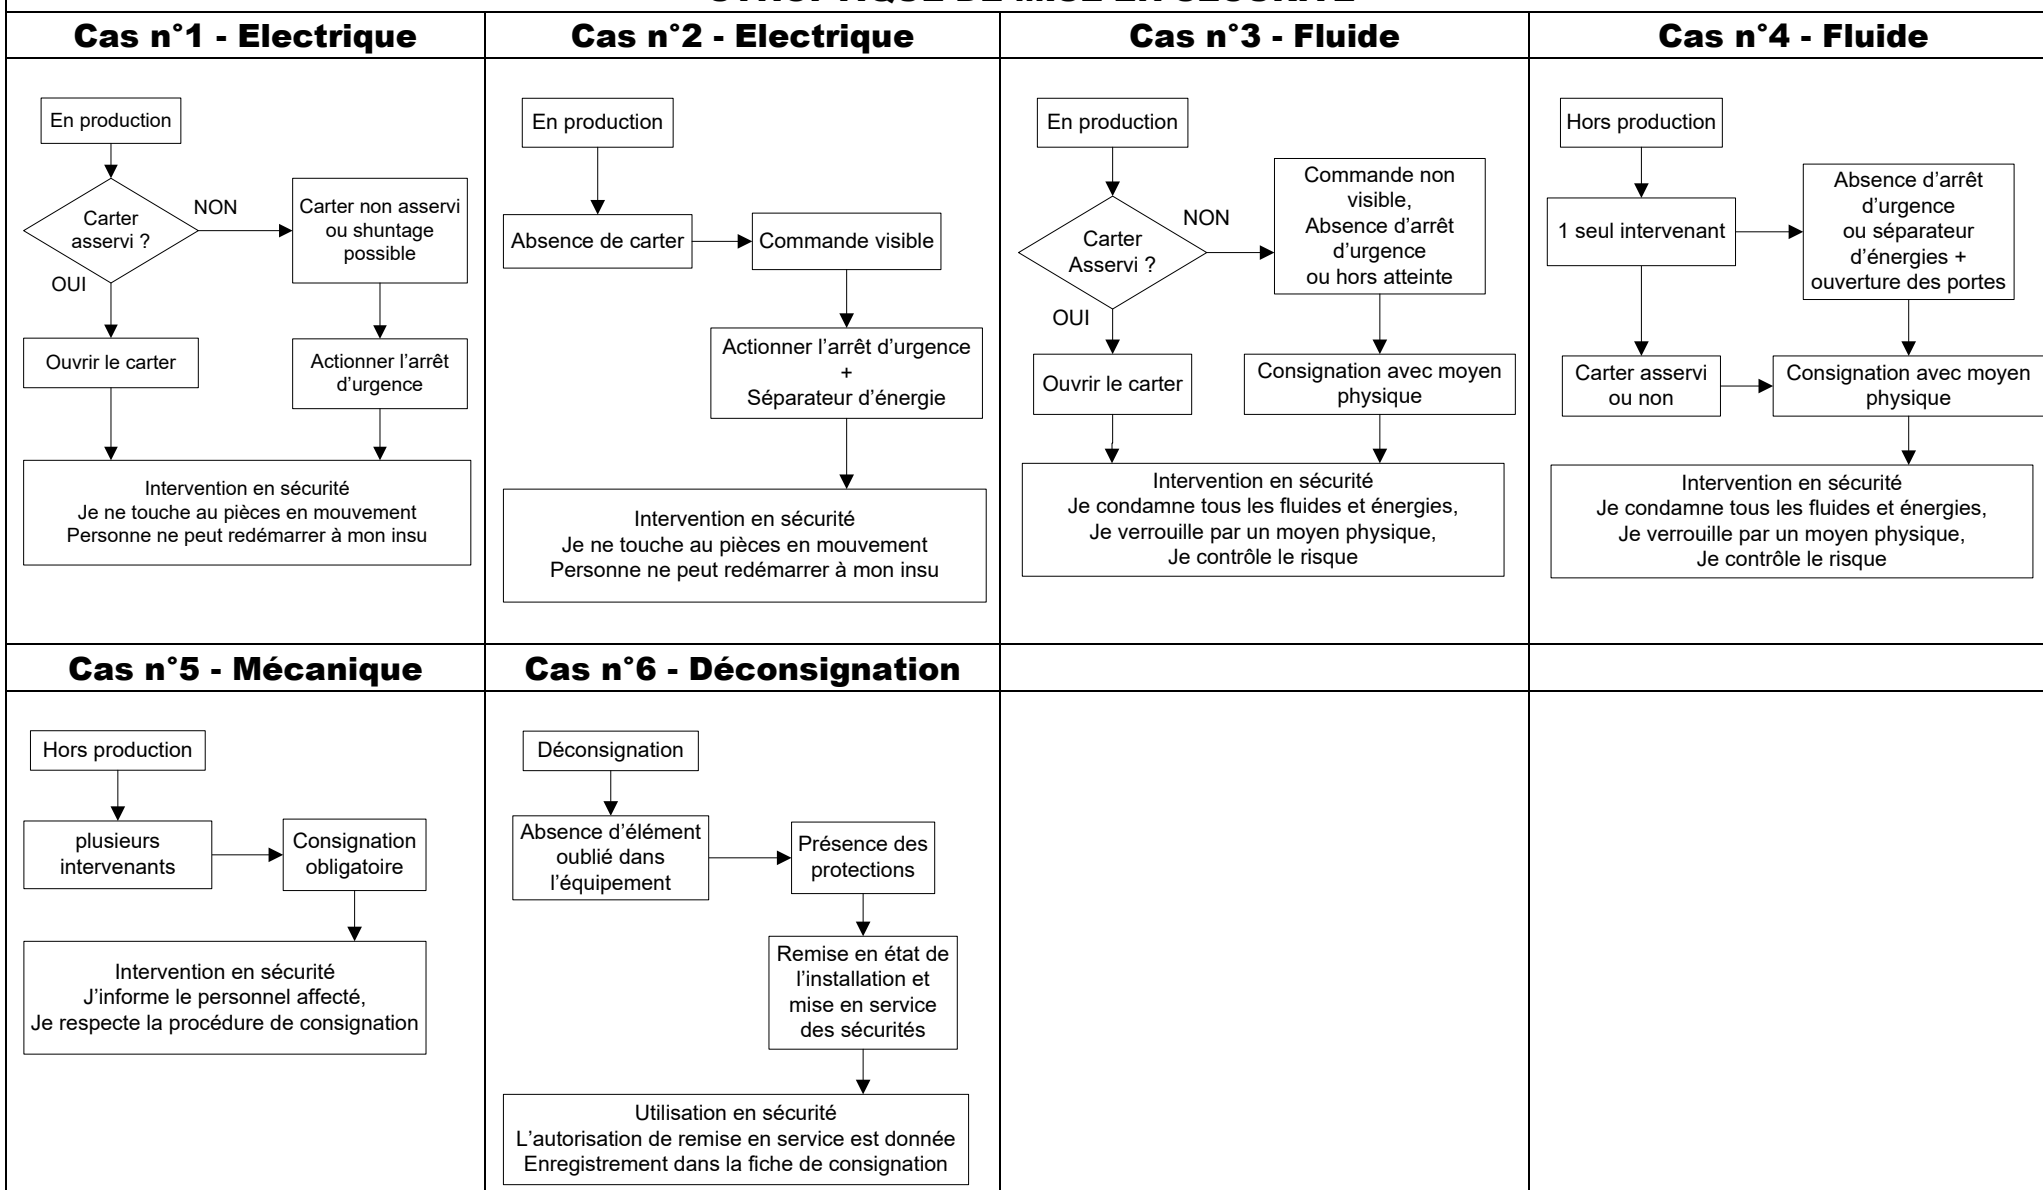

FICHE DE CONSIGNATION
